

**「矢作川総合第二期農地防災事業
北部併設水路(上流)建設工事」のお知らせ**

紅葉も少しずつ進み、朝夕は少し肌寒くなってきました。

私たちの建設工事でも本格的な機械に変わり、掘削も順調に進んでおります。


中央発條(株)さま、日精サービス(株)さまを含め、近隣の皆様には非常にご迷惑をおかけしております。

この事業を進めることで地域の発展に寄与できるよう、安全第一で作業を進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和7年10月度の工事状況と11月度以降の予定をお知らせいたします。

お気づきの点等ございましたら、右下に記載の連絡先にご一報いただきますようお願い申し上げます。

◇現在の現場状況と今後予定

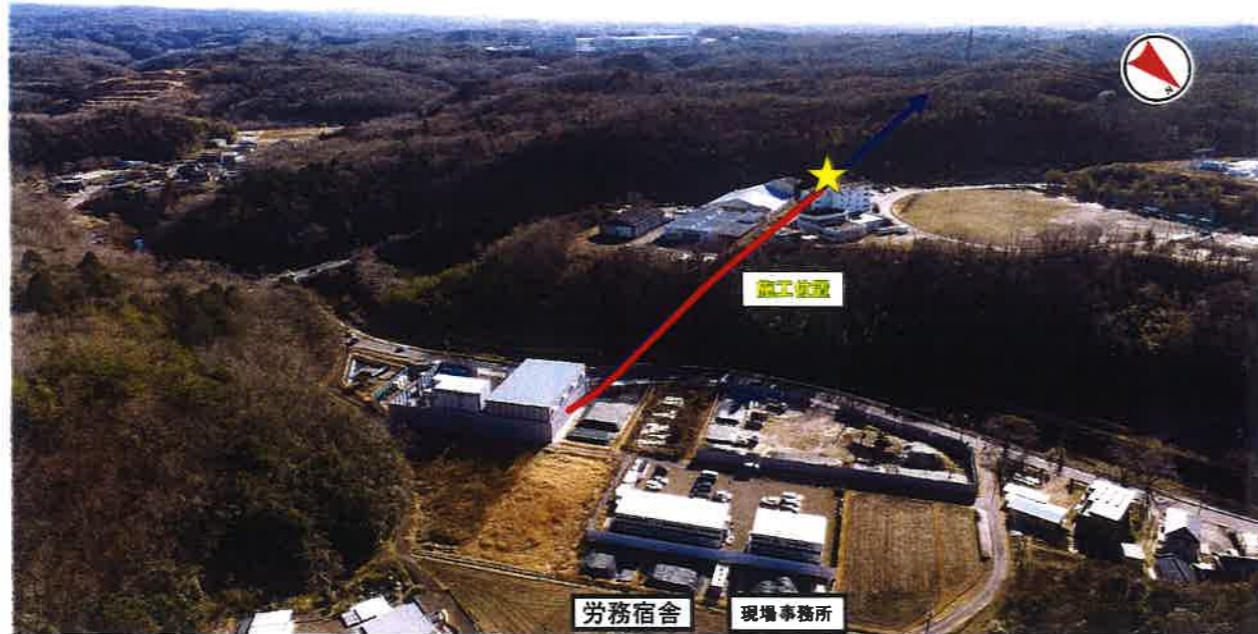

岩石の積込み状況



切羽(トンネル先端)の状況(264.4m位置)

◇お知らせ

○11月の作業予定

- ・ 11/01～：トンネル掘削
- ・ 11/25～：段取替え(右岸離合所No.2)

【重要】11月からの発破作業

11月の発破作業は、10月同様1日に2回(9:00～10:00と18:30～19:30の間の2回)予定しております。

※ただし、20:00までに発破作業が間に合わない場合は、翌日に延期します。

○工程表 ※工事内容の変更・進捗状況により、工程が変更する可能性があります。

工程	数量	単位	令和5年度												令和6年度												令和7年度												令和8年度												備 考
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
1. 準備工(測量含む)	1	式	準備																																																
2. 構造物撤去工 仮設ヤード工	1	式	構造物撤去工 仮設ヤード工																																																
3. 防音設備	1	式	防音壁設置												防音壁設置																																				撤去
3. トンネル仮設備工	1	式													トンネル仮設備工																																				
4. 立坑工	1	式													立坑工																																				
5. トンネル掘削工	1	式																									トンネル掘削																								
6. トンネル内挿管工	1	式																																					トンネル内挿管工												
7. トンネル仮設備撤去工	1	式																																					トンネル 仮設備撤去工												
8. 後片付け																																							後片付け												
			掘削準備(仮設備)・立坑工期間 令和5年2月～令和6年10月末(予定)																								トンネル掘削期間 令和6年11月～令和8年3月末(予定)																								

◇問い合わせ先

【受注者】
西松建設・TSUCHIYA JV 宮西、鍋島
TEL0565-50-5314

【発注者】農林水産省東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所 豊田支所
TEL: 0565-85-0710
